Mode Opératoire : Suivi de projet de remplacement de postes

Objet

Ce document décrit le **processus complet** de suivi du projet de remplacement des PC portables, depuis l'identification des postes à remplacer jusqu'à la clôture du suivi une fois tous les postes renouvelés.

Périmètre

Ce mode opératoire s'applique au projet de remplacement des PC portables au sein de la MACIF.

Pré-requis

- Disposer de l'accès au fichier de suivi du projet
- Disposer de l'accès à EasyVista (consultation et création de demandes/commandes)
- Avoir accès au modèle de fichier de prise de rendez-vous à partager aux utilisateurs
- Connaître les procédures internes de gestion des actifs informatiques

1) Consultation du suivi de projet

Accès au fichier de suivi

1. Ouvrir le fichier de suivi du projet de remplacement des PC portables
2. Lire attentivement le mode opératoire associé afin de respecter les règles de saisie et de suivi
3. Vérifier les informations déjà renseignées (postes déjà remplacés, en attente, en commande, etc.)

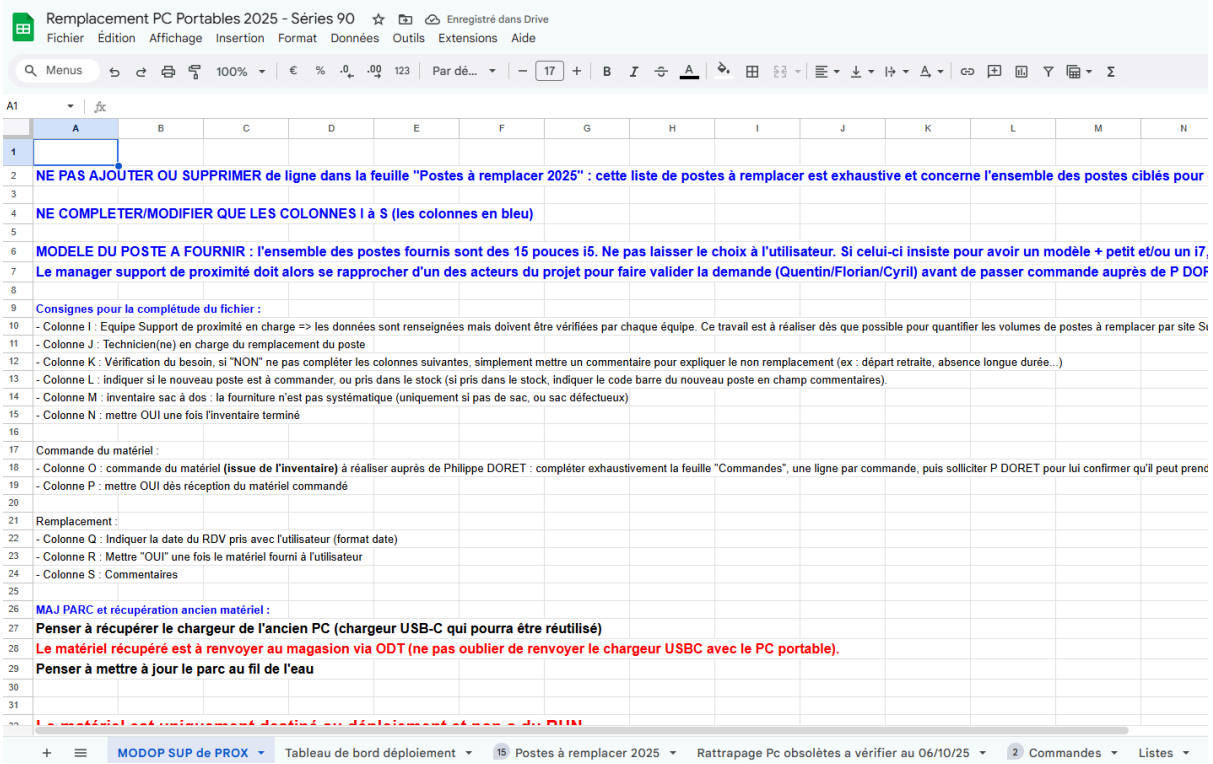

2) Identification des postes à remplacer

Consultation du nombre de postes

1. Consulter, dans le fichier de suivi, le nombre total de postes à remplacer
2. Identifier les postes concernés (référence machine, utilisateur, site, service…)
3. Vérifier la cohérence avec les données extraites d'EasyVista (inventaire, demandes existantes)

	Ciblés (extraction EV du 09/01/25)	Pas de remplacement	A faire	Inventaires finalisés	Postes reçus	RDV pr
AGEN	112	19	93	111	92	0
ANDREZIEUX	93	26	67	87	85	0
ARLES	118	18	100	112	97	0
CLERMONT	35	3	32	34	33	0
COMPIEGNE	126	27	99	117	85	0
ILLZACH	86	16	70	85	77	0
LA ROCHELLE	8	2	6	7	6	0
LAVAL	89	8	81	87	80	0
LYON	59	14	45	59	49	0
NANTES	102	31	71	69	70	0
NEMOURS	90	11	79	89	48	0
NIORT	337	67	270	213	217	0
PARIS	105	37	68	86	79	0
TOURS	92	12	79	90	80	0
VALENCE	116	15	101	116	116	0
VENDIN	163	36	127	130	130	0
YZEURE	35	5	30	35	31	0
TOTAL	**1766**	**347**	**1418**	**1527**	**1375**	**0**
		19,6%	80,3%			

Mise à jour depuis EasyVista

1. Comparer les données du fichier avec celles d'EasyVista (consultation en ligne)
2. Croiser les informations avec le fichier de suivi pour détecter les écarts
3. Corriger et compléter les données si nécessaire

1	CB	Statut	Modèle	Fin de garantie	Localisation (complète)
2	07199632	En service	THINKPAD T590 i5	18/05/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/BESSINES/NIORT BESSINES Les Ch
3	07199811	En service	THINKPAD T590 i5	28/05/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy
4	07199819	En service	THINKPAD T590 i5	28/05/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy
5	07199823	En service	THINKPAD T590 i5	28/05/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
6	06527732	En service	THINKPAD T590 i5	08/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
7	06528411	En service	THINKPAD T590 i5	30/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
8	06529377	En service	THINKPAD T590 i5	30/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
9	06528222	En service	THINKPAD T590 i5	03/07/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
10	07199957	En service	THINKPAD T590 i5	30/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
11	07199557	En service	THINKPAD T590 i5	18/05/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
12	06527992	En service	THINKPAD T590 i5	08/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
13	06527854	En service	THINKPAD T590 i5	09/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
14	07199785	En service	THINKPAD T590 i5	19/05/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
15	07199782	En service	THINKPAD T590 i5	19/05/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
16	07199787	En service	THINKPAD T590 i5	19/05/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
17	07199784	En service	THINKPAD T590 i5	19/05/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
18	06527234	En service	THINKPAD T590 i5	30/04/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
19	07199912	En service	THINKPAD T590 i5	03/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
20	07199535	En service	THINKPAD T590 i5	18/05/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
21	07199862	En service	THINKPAD T590 i5	02/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E1 Et
22	06528865	En service	THINKPAD T590 i5	09/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy - Cana/E3 Et
23	06528415	En service	THINKPAD T590 i5	30/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy/E0/000
24	07199968	En service	THINKPAD T590 i5	30/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy/E2 Etage2/23
25	06529038	En service	THINKPAD T590 i5	09/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT Tardy/E2 Etage2/23
26	06527829	En service	THINKPAD T590 i5	09/06/2025	FRANCE/NOUVELLE-AQUITAINE/DEUX-SEVRES/NIORT/NIORT J Vandier - Prés D

Mise à jour régulière

1. Mettre à jour régulièrement le fichier de suivi à partir des informations EasyVista :
    - Statut du poste
    - Date de commande
    - Date de réception
    - Date de remplacement prévue
2. S'assurer que chaque poste dispose d'un identifiant unique dans le fichier (numéro de série, nom de machine ou équivalent)
3. Corriger et compléter les données si nécessaire (changement d'utilisateur, annulation, report de rdv)

3) Passage de commande des PC

Création des commandes

1. Une fois le tri des postes à remplacer effectué, créer les demandes ou commandes de PC dans EasyVista
2. Renseigner dans EasyVista les informations nécessaires :
    - Modèle de PC
    - Quantité
    - Projet
    - Site de livraison

Mise à jour du tableau de suivi

1. Reporter immédiatement dans le fichier de suivi les informations de commande :
    - Numéro de ticket EasyVista
    - Date de commande
    - Statut de la commande
    - Date de livraison estimée

1						Traitement AsUr					
2	Vague	ZAM	AsUR Proximité	Adresse de livraison	Contacts Asur (Nom Prénom + tél) qui prend en charge la commande et la réception	Vague	Date commande AsUr (commande complète et validée par Asur)	besoin en matériel PC Portable THINKPAD 15 pouces i5	besoin en matériel PC Portable THINKPAD 13 pouces	Besoin en sac à dos	Besoin écran 24 pouces avec hub usb-c intégré (cable usb-c fourni)	Informations des poste préparatio
3	Vague 1	NORD EST	PARIS	17/21 Place Etienne Pernet 75015 Paris	Amina FAKHIR 06 08 75 22 65	Vague 1	14/01/2025	74	5	20	5	37 postes C 6 p Type= 12 postes 19 po Métier=Tél 5 Pc L13 O

4) Organisation des rendez-vous utilisateurs

Création du fichier de prise de rendez-vous

1. Créer un fichier de prise de rendez-vous (tableau partagé Excel ou Google Sheets) pour les utilisateurs concernés par le changement de PC

	A	B	C	D	E	F	H	I
1	as							
2	Date	14/02/2025						
3	Lieu	Comptoir physique 1er étage Pernet	Remplacé?	T590	L16	MAJ EV		
4	Technicien	Nadege MOUGIAMA DAOUDA						
5	Créneau 09h30	GRATTESSOLE, Mary	Oui	6527174	6541976	oui		
6	Créneau 11h	GALET, Didier	Non			Elu AMM projet X1/T14		
7	Créneau 14h	CHERCHALI, Rayan	Oui	6529189	6542152	oui		
8	Créneau 15h30	KOUASSI, Jennyfer	Oui	6527092	6542171	oui		
9								
10								
11	Date	14/03/2025						Date
12	Lieu	Comptoir physique 1er étage Pernet	Remplacé?	T590	L16	MAJ EV		Lieu
13	Technicien	Amina FAKHIR						Technicien
14	Créneau 09h30	ALLADUTT, Koraisha	Oui	7199814	6542233	ok		Créneau 09h30
15	Créneau 11h	WING, Christian	Oui					Créneau 11h
16	Créneau 14h							Créneau 14h
17	Créneau 15h30	JOLIVET, Vincent	Oui	6527223	6542182	ok		Créneau 15h30
18								
19								

Communication aux utilisateurs

1. Partager ce fichier par e-mail aux utilisateurs concernés
2. Dans l'e-mail, expliquer le contexte du projet et demander aux utilisateurs de s'inscrire sur un créneau
3. Préciser les consignes importantes (sauvegarde des données, disponibilité requise, etc.)

Suivi des inscriptions

1. Utiliser ce même fichier pour suivre l'avancement des remplacements :
    - Créneau réservé (nom de l'utilisateur)
    - Remplacement effectué (date et heure réelles)
    - Remarques éventuelles (incidents, reports...)

5) Mise à jour du suivi collectif

Mise à jour après chaque remplacement

1. Après chaque remplacement de PC, mettre à jour immédiatement le fichier de suivi collectif :
    - Statut : "Remplacé"
    - Date de remplacement effective
    - Nom du technicien intervenant
    - Éventuels incidents ou anomalies constatés
2. Veiller à ce que les informations du fichier de rendez-vous et d'EasyVista soient cohérentes avec le fichier de suivi collectif

Suivi jusqu'à finalisation

1. Poursuivre les mises à jour jusqu'au remplacement de l'ensemble des postes prévus dans le périmètre du projet
2. Organiser des points réguliers avec le chef de projet pour suivre l'avancement global
3. Anticiper les éventuels blocages (retards de livraison, utilisateurs absents, problèmes techniques…)

5) Clôture du projet

Vérifications finales

1. Vérifier que tous les postes prévus ont bien été remplacés et correctement renseignés dans le fichier de suivi
2. Contrôler que les anciens PC ont été collectés et traités selon les procédures internes (réaffectation, recyclage, destruction…)
